

Informacja
dla Zarządu Województwa Małopolskiego
o realizacji Małopolskiego Planu Inwestycyjnego
2030 oraz Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na
lata 2015-2023
(stan na 31 grudnia 2024 r.)

Opracował:

Zespół ds. Monitoringu i Realizacji Projektów (RR-XIV)
Departament Rozwoju Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

SPIS TREŚCI

I.	Realizacja Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030 w 2024 roku	4
1.	Kluczowe informacje o Małopolskim Planie Inwestycyjnym 2030	4
2.	Stan zaawansowania realizacji i efekty rzeczowe	6
3.	Podsumowanie projektów zakończonych w 2024 roku	12
4.	Analiza poziomu wydatkowania środków	13
5.	Porównanie wykonania finansowego z planowanymi nakładami	14
6.	Wykonanie finansowe w 2024 roku	16
II.	Realizacja Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 w 2024 roku	23
1.	Postęp realizacji i efekty rzeczowe	23
2.	Podsumowanie projektów zakończonych w 2024 roku	25
3.	Analiza poziomu wydatkowania środków	26
III.	Spis tabel i wykresów	28

I. REALIZACJA MAŁOPOLSKIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO 2030 W 2024 ROKU

1. KLUCZOWE INFORMACJE O MAŁOPOLSKIM PLANIE INWESTYCYJNYM 2030

Niniejszy raport przedstawia aktualny stopień realizacji **Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030** (MPI 2030). Zawarte w nim informacje dotyczą postępów w realizacji każdego z pięciu obszarów MPI 2030, podsumowanych według stanu **na dzień 31 grudnia 2024 r.**

W 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę aktualizującą MPI 2030 (Uchwała nr 1371/24 Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 25 czerwca 2024 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 1158/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030). Poza zmianami w harmonogramach finansowych i rzeczowych, aktualizacja obejmowała dodanie 9 nowych projektów: 4 w obszarze Małopolanie oraz 5 w obszarze Gospodarka.

Zaprezentowane w niniejszym raporcie zestawienia zostały opracowane na podstawie danych przekazanych przez operatorów zadań: odpowiednie departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne (WSJO) odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów ujętych w MPI 2030.

Poniższa tabela zawiera wykaz wprowadzonych w 2024 r. projektów według obszarów MPI 2030.

Tabela 1. Projekty wprowadzone do MPI 2030 w okresie 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj projektu	Nr MPI	Nazwa projektu	Obszar	Wartość projektu (zł)
1	NOWE	IIM09	Inkubator Włączenia Społecznego 2.0	Małopolanie	9 882 951
2	NOWE	IIM10	Społeczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	Małopolanie	32 502 825
3	NOWE	IIM11	Małopolska integracja FAMI	Małopolanie	41 068 889
4	NOWE	IIM12	OpenRegioCulture - Interreg Europa	Małopolanie	7 280 590
5	NOWE	IG09 CI	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana	Gospodarka	7 787 340

Lp.	Rodzaj projektu	Nr MPI	Nazwa projektu	Obszar	Wartość projektu (zł)
6	NOWE	IG09 CJ	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	Gospodarka	36 750 000
7	NOWE	IG09 CK	Obwodnica Łącka	Gospodarka	99 468 688
8	NOWE	IG09 CL	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego	Gospodarka	49 002 866
9	NOWE	IG13 H	Małopolska Karta Aglomeracyjna etap III	Gospodarka	19 024 392
RAZEM					302 768 541

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

W ramach MPI 2030 przewidziano do realizacji **103¹ projekty**. Z tej liczby 15 przedsięwzięć zostało usuniętych lub zaniechano ich realizacji. **Obecnie MPI 2030 obejmuje 88 projektów, które zostały uwzględnione w niniejszym raporcie.**

Wartość projektów (bez tych wycofanych²) wynosiła ponad **5,05 mld zł**.

Poniżej wykaz projektów wycofanych w 2024 r.:

w obszarze Małopolskie:

- **IIM07 Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji** – zadanie zostało usunięte ponieważ nie spełniało wymagań zaktualizowanych kryteriów wpisywania projektów do MPI 2030.
- **IIM08 Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie** – zadanie zostało usunięte ponieważ nie spełniało wymagań zaktualizowanych kryteriów wpisywania projektów do MPI 2030.

w obszarze Gospodarka:

- **IG12 A Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowia** - zadanie zostało zaniechane. Decyzja wynikała z analizy projektów planowanych do realizacji w obszarze e-zdrowia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
- **IG12 B Regionalny Monitoring Zdrowotny** - zadanie zostało zaniechane z powodów technicznych. Realizacja projektu nie jest możliwa ze względu na brak danych oraz

¹ 103 projekty to liczba wszystkich projektów: usuniętych, zaniechanych, w trakcie realizacji, nierozpoczętych i zakończonych, zgodnie z aktualizowaną corocznie Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

² W skład projektów wycofanych wchodziły projekty usunięte i zaniechane.

narzędzi analitycznych. Jest to związane z założeniami projektu Małopolski System Informacji Medycznej, który przewidywał stworzenie mechanizmu wtórnego wykorzystania danych medycznych w ramach Platformy Regionalnej. Mechanizm ten stanowi etap III umowy z Wykonawcą, możliwy do uruchomienia w ramach prawa opcji. W wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli zostały sformułowane wątpliwości dotyczące prawnych podstaw wtórnego wykorzystania danych medycznych pacjentów przez Województwo Małopolskie.

2. STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI I EFEKTY RZECZOWE

Na koniec 2024 roku do MPI 2030 wpisanych było 88 projektów. Najwięcej projektów, bo 43, było wpisanych w obszarze Gospodarka, co znalazło również odzwierciedlenie w wartości tych projektów, która wyniosła ponad 2,9 mld zł.

Tabela 2. Liczba oraz wartość projektów według obszarów MPI 2030

Obszar	Liczba projektów				Wartość projektów (zł)
	Nierozpoczętych	W trakcie realizacji	Zakończonych	Łącznie	
MAŁOPOLANIE	9	21	6	36	1 831 411 799
GOSPODARKA	16	25	2	43	2 941 831 118
KLIMAT I ŚRODOWISKO	2	5	0	7	264 999 057
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	0	1	0	1	8 000 000
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	1	0	0	1	10 191 297
RAZEM	28	52	8	88	5 056 433 271


Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Z analizy statusów wszystkich projektów wynika, że spośród nich:

- 28 projektów nie zostało dotychczas rozpoczętych,
- 52 projekty są w trakcie realizacji,
- 8 projektów zostało zakończonych, w tym 3 projekty zostały zakończone w 2024 roku.

Stopień realizacji projektów w ramach poszczególnych obszarów MPI 2030 prezentuje poniższy wykres:

Wykres 1. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 2030

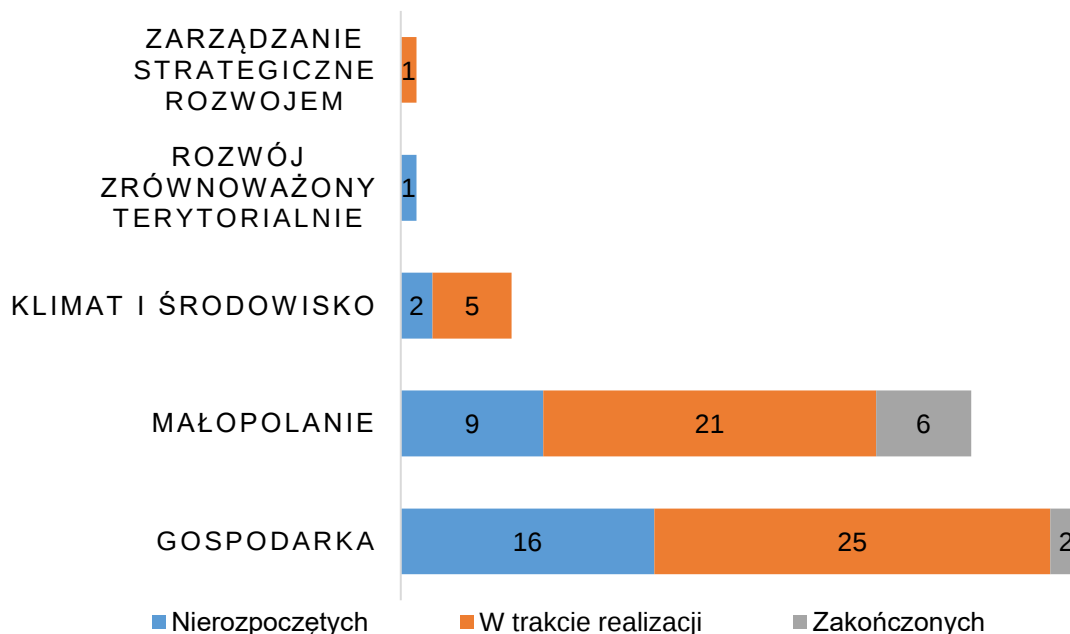

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Tabela 3. Projekty ujęte w MPI 2030

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Aktualna wartość (zł) ³
1	IM01 A	Inkubator Włączenia Społecznego	6 212 842
2	IM01 B	Małopolskie Centra Usług Społecznych	35 999 990
3	IM01 C	Po pierwsze rodzina	21 000 000
4	IM01 D	Usługa Wrażliwa	10 000 000
5	IM02	Małopolski Tele-Anioł 2.0	155 734 529
6	IM03	Cyfrowy Asystent 1.0 - pilotaż	51 448
7	IM04 B	Centrum chorób rzadkich	25 000 000
8	IM05 A	Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie- Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe	6 138 890
9	IM05 B	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna	65 696 675

³ Aktualna wartość według stanu na dzień 25.06.2024 r. (Uchwała nr 1371/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 czerwca r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1158/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030).

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Aktualna wartość (zł) ³
10	IM05 C	Bezpieczna Małopolska - Etap 1 samochody ratownictwa górskiego	1 327 525
11	IM05 D	Bezpieczna Małopolska - Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej	13 128 416
12	IM06	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	451 227 828
13	IM07	Muzea Domowe ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski	801 499
14	IM08 A	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	48 741 431
15	IM08 B	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii	16 841 082
16	IM08 C	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji muzeum zamek w Dębnie	44 248 347
17	IM09	Wirtualne Muzea Małopolski 2030	8 534 000
18	IM10 A	Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany	283 924 569
19	IM10 B	Cogiteon w zasięgu!	30 000 000
20	IM11 A	Małopolski Program Wspierania Uczniów	42 988 660
21	IM11 B	Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej	38 485 329
22	IM11 C	Małopolski Dwujęzyczny Maluch	61 147 786
23	IM12 A	Zawodowa Małopolska	15 944 501
24	IM12 B	Powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkich Zespołów Koordynacji - koordynacja na szczeblu regionalnym w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	24 334 576
25	IM14	Małopolski Pociąg do Kariery	90 000 000
26	IM14 B	Małopolski Pociąg do Kariery 2	75 000 000
27	IM15 C	Nowy start w Małopolsce z EURESem	6 999 932
28	IM15 DA	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 1)	19 999 988
29	IM15 DB	Żyj i pracuj w Małopolsce (etap 2)	23 000 011
30	IM15 BA	Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy	34 000 000
31	IM15 BB	Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy 2.0	66 000 000
32	IIM03	Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej	18 166 690
33	IIM09	Inkubator Włączenia Społecznego 2.0	9 882 951

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Aktualna wartość (zł) ³
34	IIM10	Spółeczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	32 502 825
35	IIM11	Małopolska integracja FAMI	41 068 889
36	IIM12	OpenRegioCulture - Interreg Europa	7 280 590
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W OBSZARZE MAŁOPOLANIE			1 831 411 799
37	IG01 A	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją	15 682 721
38	IG02	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	13 824 189
39	IG03 A	Business in Małopolska. Together for future	10 490 000
40	IG04	Małopolska Przedsiębiorcza	23 000 000
41	IG05	Budowa Centrum Skupu Produktów Rolno – Spożywczych i Dystrybucji	350 000 000
42	IG06	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	136 083 932
43	IG07 A	Małopolska – cel podróży	24 000 000
44	IG08 A	Na górskich szlakach Małopolski	36 179 094
45	IG09 AA	Połączenie węzła A4 Bochnia z DK94 etap II	138 000 000
46	IG09 AB	Budowa połączenia węzła A4 Bochnia z DK94 etap III	139 260 500
47	IG09 AC	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 etap II	199 999 984
48	IG09 BA	Most na rzece Kamienica w miejscowości Kamienica	45 000 000
49	IG09 BB	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich – Polski Ład	264 988 409
50	IG09 BC	Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ	60 000 000
51	IG09 BD	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 w m. Chelmek	100 000 000
52	IG09 CA	Obwodnica Brzeszcz	89 400 003
53	IG09 CB	Obwodnica Jankowic i Olsztyn	53 500 000
54	IG09 CC	Obwodnica Klucz	68 000 000
55	IG09 CD	Obwodnica Lisiej Góry	107 695 500
56	IG09 CE	Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic	54 523 097
57	IG09 CF	Obwodnica Proszowic etap II	73 428 037
58	IG09 CG	Obwodnica Szczurowej	55 397 050
59	IG09 CH	Obwodnica Zielonek etap II	70 000 000

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Aktualna wartość (zł) ³
60	IG09 CI	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana	7 770 430
61	IG09 CJ	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	36 750 000
62	IG09 CK	Obwodnica Łącka	99 468 688
63	IG09 CL	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego	49 002 866
64	IG10 A	Przeprowadzenie prac analitycznych w celu określenia kierunków i standardów rozwoju siatki regionalnych połączeń kolejowych w Małopolsce	3 870 810
65	IG10 B	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych - FEM	345 471 037
66	IG11 BA	Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna	21 204 850
67	IG11 BB	Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi w ciągu DW 977 w m. Nowodworze	17 035 252
68	IG12 C	Rozwój e-zdrowia w województwie małopolskim	125 378 151
69	IG13 A	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce	4 993 430
70	IG13 B	Rozbudowa systemu upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich etap II	1 400 000
71	IG13 C	System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem w skutek przeciążenia	10 569 108
72	IG13 D	Bezpieczny Urząd	46 000 000
73	IG13 E	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce	8 000 000
74	IG13 F	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM	7 000 000
75	IG13 G	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego	8 000 000
76	IG13 H	Małopolska Karta Aglomeracyjna etap III	19 024 392
77	IG14	GOZ dla przedsiębiorcy	318 000
78	IIG02	Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego w stacji Oświęcim	55 059 088
79	IIG03	Zakup nowoczesnych autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) wraz ze świadczeniem usług serwisowych	27 062 500
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W OBSZARZE GOSPODARKA			2 941 831 118
80	IKiŚ01	Przyjazne klimatyczne budynki użyteczności publicznej	84 242 825

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Aktualna wartość (zł) ³
81	IKiŚ02 A	Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi	20 341 352
82	IKiŚ02 B	Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w Krakowie	49 757 738
83	IKiŚ02 C	Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziba Oddziału ZPKWM w Rytrze	14 523 406
84	IKiŚ03 A	LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	70 978 750
85	IKiŚ04	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	22 154 986
86	IIKiŚ01	Jurajski Geopark	3 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W OBSZARZE KLIMAT I ŚRODOWISKO			264 999 057
87	IZSR01	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego	8 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W OBSZARZE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM			8 000 000
88	IIRZT01	Budowanie sieci współpracy oraz monitoring procesu sprawiedliwej transformacji w województwie małopolskim	10 191 297
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW W OBSZARZE ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE			10 191 297
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW WE WSZYSTKICH OBSZARACH			5 056 433 271

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

3. PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH W 2024 ROKU

Spośród wszystkich 88 projektów ujętych w MPI 2030, w 2024 r. zakończono **3 projekty**: 2 w obszarze Małopolskie oraz 1 w obszarze Gospodarka.

Obszar Małopolskie:

- **IM10 A Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany** – zrealizowano działania formalne związane z zamknięciem rzeczowej realizacji projektu, w tym uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz drogi dojazdowej. W czerwcu 2024 r. Cogiteon rozpoczął działalność edukacyjną w nowo wybudowanym obiekcie.
- **IIM03 Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej** – zakończono realizację wystawy - ekspozycji muzealnej wraz z dostawą wyposażenia.

Obszar Gospodarka:

- **IG09 CG Obwodnica Szczurowej** – zakończono prace związane z budową odwodnienia, w tym przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów krytych, drenaży. Ponadto, wykonano konstrukcję nawierzchni na drodze głównej oraz w rejonach skrzyżowań z drogami gminnymi. Zrealizowano również budowę oświetlenia w rejonie ronda na skrzyżowaniu z DW 768, a także wykonano ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla zwierząt.

Łączna liczba oraz wartość projektów zakończonych do końca 2024 r. w poszczególnych obszarach tematycznych MPI 2030 została ujęta w poniższej tabeli.

Tabela 4. Liczba oraz wartość projektów zakończonych według obszarów MPI 2030

Obszar	Liczba projektów zakończonych	Wartość projektów zakończonych (zł)
Małopolskie	6	322 811 490
Gospodarka	2	79 397 050
Razem		402 208 540

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>


4. ANALIZA POZIOMU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

Łączna wartość projektów ujętych w MPI 2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **5 056 433 271 zł**, z czego **736 122 684 zł** zostało już wydatkowane, co stanowi ponad **14,5%**. Pozostała do wydatkowania kwota to **4 320 310 587 zł**.

Zauważalny wzrost poziomu wydatkowania w ramach MPI 2030 wynika ze zwiększenia liczby projektów będących w trakcie realizacji.

Zbiorcze zestawienie dotyczące stanu realizacji całego MPI 2030 zarówno w ujęciu całościowym, jak i według poszczególnych obszarów, znajduje się w dalszej części raportu.


Wykres 2. Wydatki na realizację MPI 2030 w latach do 31 grudnia 2024 r. (mln zł)

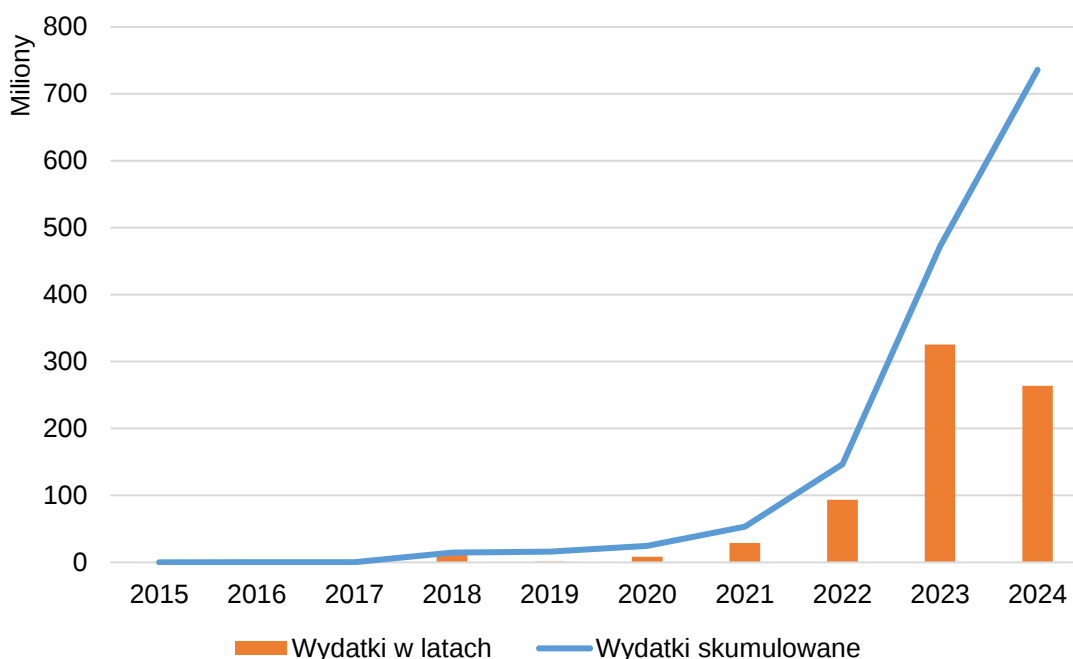

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Zgodnie z poniższym wykresem z kwoty wydatkowanej na realizację MPI 2030 do 31 grudnia 2024 r. najwięcej środków pochodziło z **budżetu Województwa Małopolskiego (BW)** – 72% środków. Wydatki z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)** oraz **Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027)** wyniosły łącznie 14%. **Budżet Państwa (BP)** pokrył 2% wydatków, a **pozostałe źródła (Inne)** stanowiły łącznie 12%.

Wykres 3. Środki wydatkowane na realizację MPI 2030 do 2024 r. według źródeł finansowania

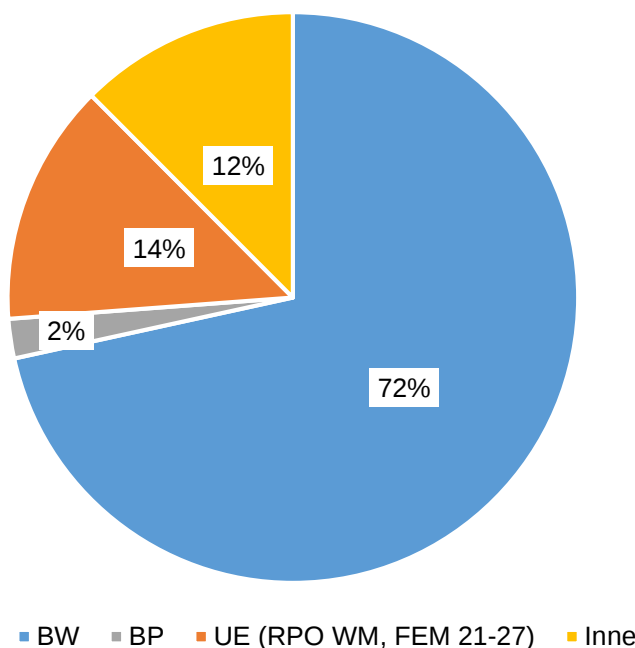

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

5. PORÓWNANIE WYKONANIA FINANSOWEGO Z PLANOWANYMI NAKŁADAMI

W poniższych tabelach przedstawiono poziom zaangażowania środków w poszczególnych obszarach tematycznych MPI 2030. Tabela 5 przedstawia stopień wydatkowania środków w stosunku do całości planowanych nakładów na dany obszar. Z kolei tabela 6 prezentuje kwoty pozostające do wydatkowania na realizację projektów w danym obszarze.

Tabela 5. Wykonanie finansowe w odniesieniu do planów do 2024 r. według obszarów MPI 2030 (mln zł)

Obszar	Wartość całkowita (zł)	Plan z 2015 r. do 31.12.2024 r. (zł)	Wykonanie za okres 2015 r. – 31.12.2024 r. (zł)
MAŁOPOLANIE	1 831 411 799	562 295 859	394 988 289
GOSPODARKA	2 941 831 118	538 285 341	314 122 651
KLIMAT I ŚRODOWISKO	264 999 057	35 462 554	26 546 134
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	8 000 000	1 523 000	465 610

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	10 191 297	0	0
Razem	5 056 433 271	1 137 566 754	736 122 684

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Na koniec roku 2024 najwyższy poziom realizacji – **ponad 21%** względem całości zaplanowanych wydatków – osiągnięto w obszarze Małopolskie. Należy jednak zaznaczyć, że wynik ten jest częściowo zawyżony ze względu na dwa kluczowe projekty: **IM10 A Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon** oraz **IM06 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie**, które zostały przeniesione z MPI 2015-2023 i będą realizowane od 2015 r.

Brak wydatkowania środków odnotowano w obszarze Rozwój Zrównoważony Terytorialnie. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć w tym obszarze przewidziano na 2025 rok.

Tabela 6. Środki pozostałe do wydania na realizację projektów MPI 2030 według obszarów (mln zł)

Obszar	Wartość całkowita (zł)	Kwota wydatkowana do 31.12.2024 r. (zł)	Procent wykonania	Kwota pozostała do wydatkowania na realizację projektów w danym obszarze (zł)
MAŁOPOLANIE	1 831 411 799	394 988 289	21,57%	1 436 423 510
GOSPODARKA	2 941 831 118	314 122 651	10,67%	2 627 708 467
KLIMAT I ŚRODOWISKO	264 999 057	26 546 134	10,01%	238 452 923
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	8 000 000	465 610	5,82%	7 534 390
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	10 191 297	0,00	0%	10 191 297
Razem	5 056 433 271	736 122 684	14,55%	4 320 310 587

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

6. WYKONANIE FINANSOWE W 2024 ROKU

Na realizację przedsięwzięć w 2024 r. w ramach MPI 2030 zaplanowano kwotę **611 196 628 zł**, z czego wydatkowano **263 596 907 zł**, co stanowi prawie **43,13%** planowanej wartości.

Najwyższy poziom wykonania w badanym okresie odnotowano w obszarze Klimat i Środowisko, natomiast najniższy w obszarze Rozwój Zrównoważony Terytorialnie, gdzie nie wydatkowano jeszcze żadnych środków.

Tabela 7. Wykonanie finansowe MPI 2030 w 2024 r. w odniesieniu do planu na 2024 r.

Obszar	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Procent wykonania
MAŁOPOLANIE	217 506 713 zł	68 266 894 zł	31,39%
GOSPODARKA	372 346 944 zł	183 168 305 zł	49,19%
KLIMAT I ŚRODOWISKO	19 819 971 zł	11 696 098 zł	59,01%
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM	1 523 000 zł	465 610 zł	30,57%
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE	0 zł	0 zł	0%
Razem	611 196 628 zł	263 596 907 zł	43,13%

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Podsumowanie	OBSZARY ŁĄCZNIE
Liczba projektów MPI 2030	88
Wartość projektów MPI 2030	5 056 433 271 zł

Stan realizacji na 31.12.2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
52	59%	28	32%	8	9%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1 137 566 754 zł	736 122 684 zł	64,71%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
611 196 628 zł	263 596 907 zł	43,13%




Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Nazwa obszaru	MAŁOPOLANIE
Skrót	M
Liczba projektów	36
Wartość projektów	1 831 411 799

Stan realizacji na 31.12.2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
21	58,34%	9	25%	6	16,66%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
562 295 859 zł	394 988 289 zł	70,24%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
217 506 713 zł	68 266 894 zł	31,39%

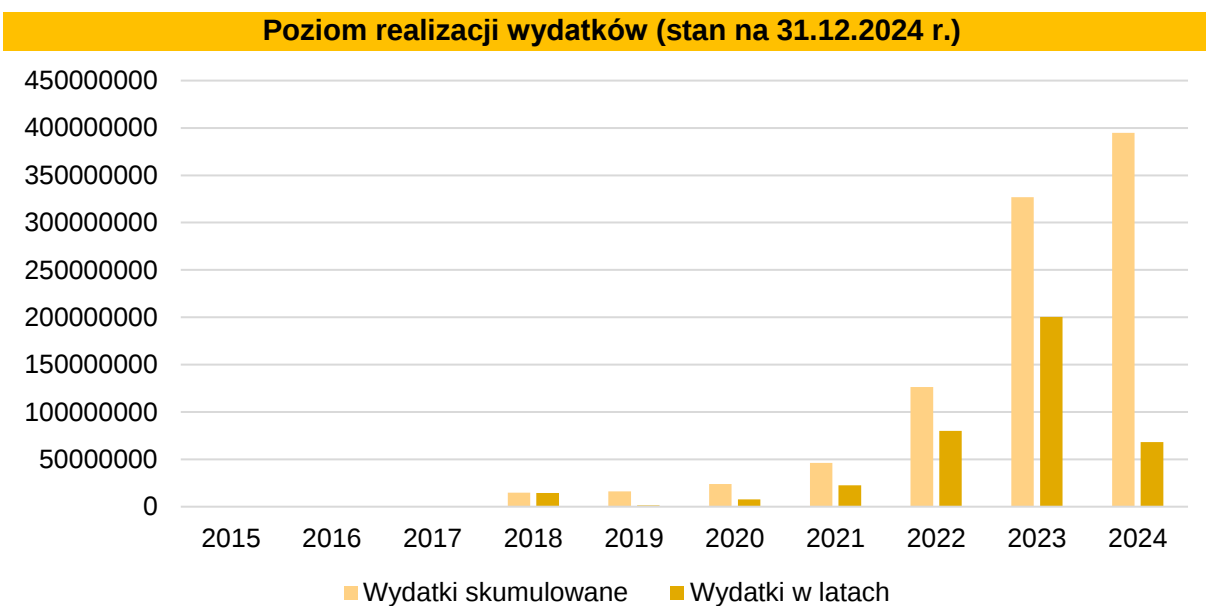


Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Nazwa obszaru	GOSPODARKA
Skrót	G
Liczba projektów	43
Wartość projektów	2 941 831 118

Stan realizacji na 31.12. 2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
25	58,15%	16	37,20%	2	4,65%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
538 285 341 zł	314 122 651 zł	58,35%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
372 346 944 zł	183 168 305 zł	49,19%

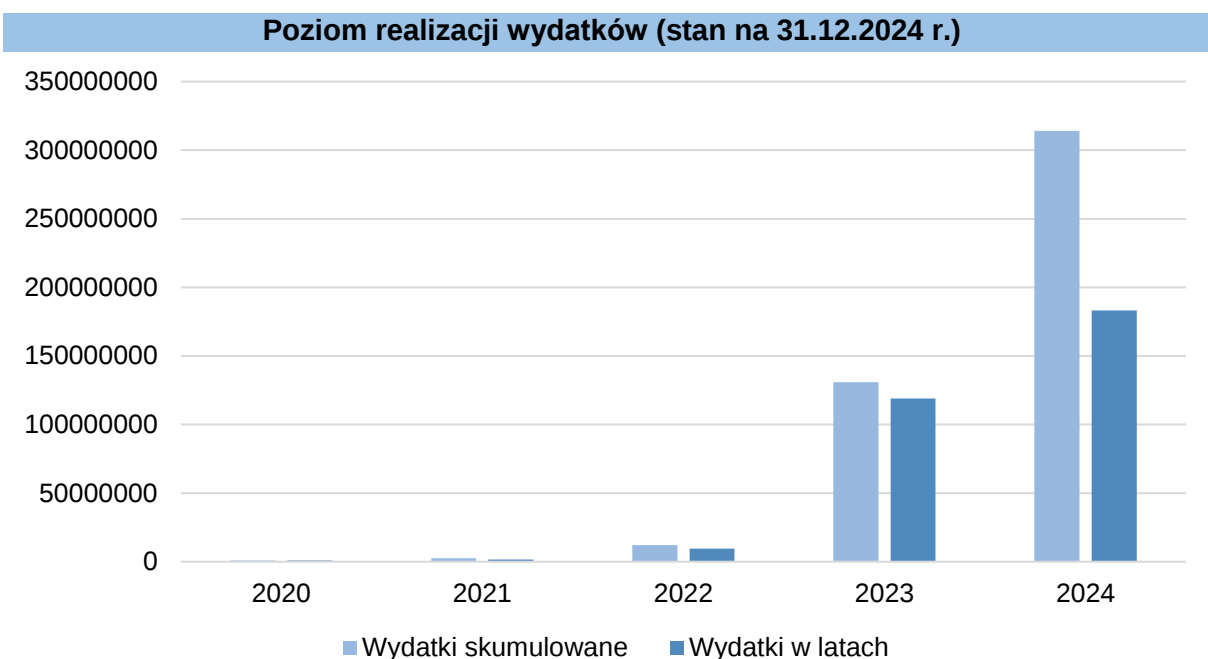


Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Nazwa obszaru	KLIMAT I ŚRODOWISKO
Skrót	KiŚ
Liczba projektów	7
Wartość projektów	264 999 057

Stan realizacji na 31.12.2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
5	67%	2	33%	0	0%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
35 462 554 zł	26 546 134 zł	74,85%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
19 819 971 zł	11 696 098 zł	59,01%

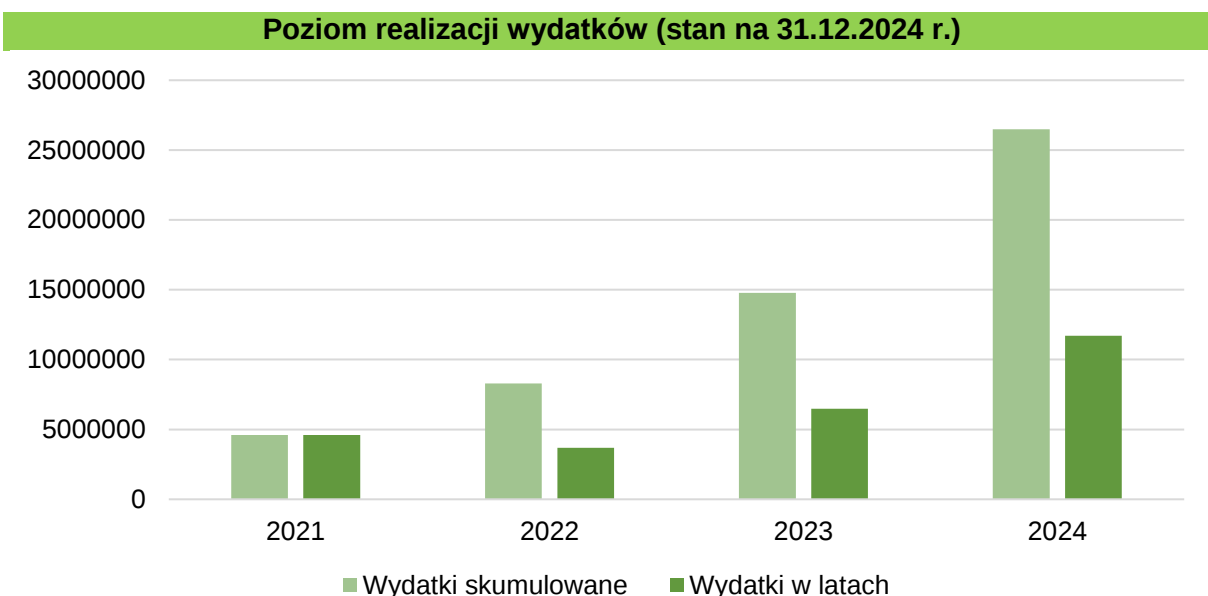

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Nazwa obszaru	ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM
Skrót	ZSR
Liczba projektów	1
Wartość projektów	8 000 000

Stan realizacji na 31.12.2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
1	100%	0	0%	0	0%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1 523 000 zł	465 610 zł	30,57%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
1 523 000 zł	465 610 zł	30,57%



Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Nazwa obszaru	ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE
Skrót	RZT
Liczba projektów	1
Wartość projektów	10 191 297

Stan realizacji na 31.12.2024 r.					
Projekty					
W trakcie realizacji		Nierozpoczęte		Zakończone	
Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
0	0%	1	100%	0	0%

Poziom wydatkowania łącznie do 2024 r.		
Plan do 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
0 zł	0 zł	0%

Poziom realizacji planu w 2024 r.		
Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)	Wykonanie jako % planu na 2024 r. (1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.)
0 zł	0 zł	0%

II. REALIZACJA MAŁOPOLSKIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2015-2023 W 2024 ROKU

1. POSTĘP REALIZACJI I EFEKTY RZECZOWE

Na koniec 2024 r. do Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 (MPI 2015-2023) wpisane było **209 projektów** o łącznej wartości ponad **5,6 mld zł**. Najwięcej projektów, bo aż 74 znajdowało się w obszarze Transport i generowały one najwyższą kwotę – ponad 2,7 mld zł.

Tabela 8. Liczba oraz wartość projektów według obszarów MPI 2015-2023


Obszar	Nazwa obszaru	Liczba projektów	Wartość projektów (zł)
CM	CYFROWA MAŁOPOLSKA	3	72 220 811
ED	EDUKACJA	15	276 444 600
KD	DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO	34	315 101 024
OS	OCHRONA ŚRODOWISKA	10	506 369 128
RG	ROZWÓJ GOSPODARCZY	11	313 482 428
ZR	ZDROWIE	32	1 087 004 599
PS	POLITYKA SPOŁECZNA	12	106 372 436
RP	RYNEK PRACY	12	219 586 455
PR	POLITYKA ROZWOJU	6	33 860 993
TR	TRANSPORT	74	2 727 609 970
Razem MPI 2015-2023		209	5 658 052 445

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Do 31 grudnia 2024 r. zakończono realizację **202** z 209 projektów wpisanych do MPI 2015-2023, co stanowi ponad **96%** liczby wszystkich projektów ujętych w MPI 2015-2023. W trakcie realizacji pozostaje jeszcze **7 projektów** o łącznej wartości **589 361 140 zł**.

Stopień realizacji projektów w ramach poszczególnych obszarów MPI 2015-2023 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 4. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 2015-2023

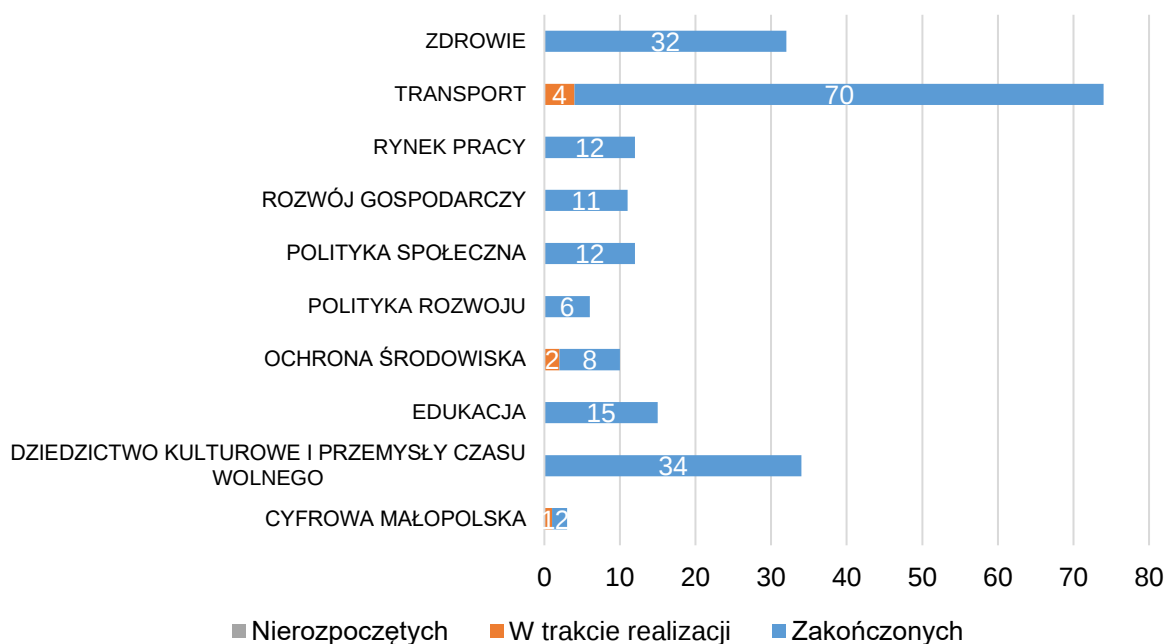

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

Tabela 9. Projekty w trakcie realizacji ujęte w MPI 2015-2023

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Wartość projektów (zł)
1	TR62	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II	48 509 965
2	TR63	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	10 280 000
3	TR67	Budowa węzła drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik	193 000 000
4	TR70	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej	17 886 301
Łączna wartość projektów w obszarze Transport			269 676 266
5	OS3-OS4 i OS6-OS11	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim	217 480 804
6	OS14	Małopolska w zdrowej atmosferze	74 287 005
Łączna wartość projektów w obszarze Ochrona Środowiska			291 767 809
7	CM2/K	Zintegrowany system informatyczny – etap II	27 917 065
Łączna wartość projektów w obszarze Cyfrowa Małopolska			27 917 065

Lp.	Nr MPI	Nazwa projektu	Wartość projektów (zł)
Łączna wartość projektów we wszystkich obszarach MPI 2015-2023			589 361 140

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

2. PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ZAKOŃCZONYCH W 2024 ROKU

Spośród wszystkich 209 projektów realizowanych w ramach MPI 2015-2023, w 2024 r. zakończono **5 przedsięwzięć** – 2 w obszarze: Dziedzictwo Kulturowe i Przemysły Czasu Wolnego oraz po 1 w obszarach: Zdrowie, Transport i Edukacja.

Obszar Dziedzictwo Kulturowe i Przemysły Czasu Wolnego:

- **KD9 Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - zagospodarowanie terenu (w tym tereny zielone) przy ul. Babińskiego 29 - Pawilon na zbiory.** Przeprowadzono postępowania na dostawę i montaż wyposażenia wraz z realizacją, w tym przygotowanie konserwatorskie obiektów, zabezpieczenie i przeprowadzkę zbiorów. Zmodernizowano przestrzeń recepcyjną w siedzibie Muzeum, poprzez dostosowanie windy oraz powierzchni podłogowych do wymogów prawnych,
- **KD34 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.** Zakupiono nowoczesne wyposażenie, wykonano ekspozycje stałe i przeprowadzono konserwację wybranych muzealiów.

Obszar Zdrowie:

- **ZR32 Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy.** Zakończono realizację robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budynku i zagospodarowania terenu. Dostarczono i zamontowano wyposażenie inwestycyjne (w tym sprzęt medyczny). W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany budynek szpitalny nr 6A i jest on w pełni dostosowany do potrzeb pacjentów oraz pracowników Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze i Zespołu Leczenia Środowiskowego Kraków Podgórze, funkcjonujących w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze.

Obszar Transport:

- **TR75 Rozbudowa DW 969 – etap II.** Zakończono rozbudowę drogi w m. Zabrzeż na długości 1,26 km. Projekt został zrealizowany w latach 2023-2024.

Obszar Edukacja:

- **ED5 Modernizacja bazy dydaktycznej MOW prowadzone przez Woj. Małopolskie - Rozbudowa i modernizacja MOW w Mszanie Dolnej.** Zadanie obejmowało kontynuację

etapu II zadania tj. przebudowę budynku dworu na budynek szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku zakończenia inwestycji budynek dworu został zmodernizowany na cele dydaktyczne. W 2024 r. zakończono prace związane z ociepleniem poddasza, wykonano prace wykończeniowe, a także zakończono prace związane z kanalizacją deszczową i instalacją wodociągową.

Tabela 10. Liczba oraz wartość projektów zakończonych według obszarów MPI 2015-2023

Obszar	Nazwa obszaru	Liczba projektów zakończonych	Wartość projektów zakończonych (zł)
CM	CYFROWA MAŁOPOLSKA	2	44 303 746
ED	EDUKACJA	15	276 444 600
KD	DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO	34	315 101 024
OS	OCHRONA ŚRODOWISKA	8	214 601 319
RG	ROZWÓJ GOSPODARCZY	11	313 482 428
ZR	ZDROWIE	32	1 087 004 599
PS	POLITYKA SPOŁECZNA	12	106 372 436
RP	RYNEK PRACY	12	219 586 455
PR	POLITYKA ROZWOJU	6	33 860 993
TR	TRANSPORT	70	2 457 933 705
RAZEM		202	5 068 691 305


Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

3. ANALIZA POZIOMU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

Łączna wartość projektów ujętych w MPI 2015-2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **5 658 052 445 zł**, z czego **5 354 182 209 zł** zostało już wydatkowane, co stanowi prawie **95% całości**. Kwota pozostała do wydatkowania to **306 870 236 zł (5% wartości wszystkich projektów)**.

Poziom wydatkowania jest taki sam jak w roku ubiegłym, jednak wartość projektu w obszarze Transport zwiększyła się o 264% w stosunku do roku 2023, osiągając obecnie wartość 193 000 000 zł.

Wykres 5. Realizacja MPI 2015-2023 w latach do 31 grudnia 2024 r. (mln zł)

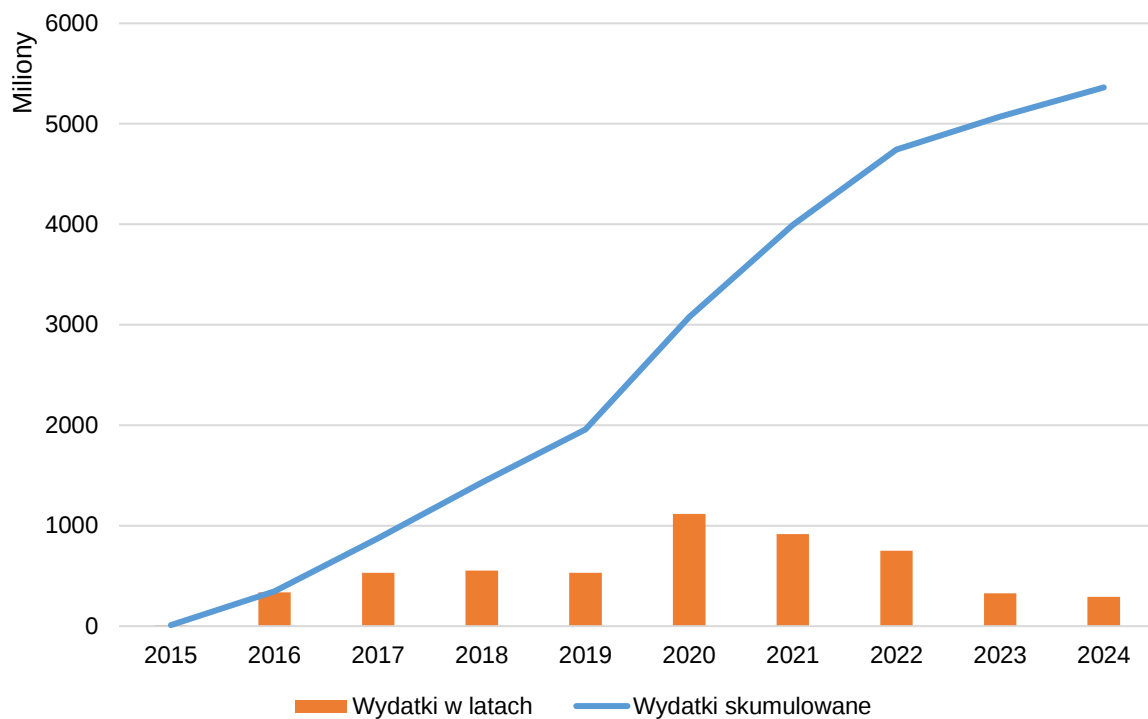

Źródło: opracowanie własne UMWM, na podstawie danych z systemu <https://intradok.umwm.malopolska.pl/>

III. SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabele:

Tabela 1. Projekty wprowadzone do MPI 2030 w okresie 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.	4
Tabela 2. Liczba oraz wartość projektów według obszarów MPI 2030.....	6
Tabela 3. Projekty ujęte w MPI 2030	7
Tabela 4. Liczba oraz wartość projektów zakończonych według obszarów MPI 2030	12
Tabela 5. Wykonanie finansowe w odniesieniu do planów do 2024 r. według obszarów MPI 2030 (mln zł)	14
Tabela 6. Środki pozostałe do wydania na realizację projektów MPI 2030 według obszarów (mln zł)	15
Tabela 7. Wykonanie finansowe MPI 2030 w 2024 r. w odniesieniu do planu na 2024 r.....	16
Tabela 8. Liczba oraz wartość projektów według obszarów MPI 2015-2023.....	23
Tabela 9. Projekty w trakcie realizacji ujęte w MPI 2015-2023.....	24
Tabela 10. Liczba oraz wartość projektów zakończonych według obszarów MPI 2015-2023	26

Wykresy:

Wykres 1. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 2030	7
Wykres 2. Wydatki na realizację MPI 2030 w latach do 31 grudnia 2024 r. (mln zł).....	13
Wykres 3. Środki wydatkowane na realizację MPI 2030 do 2024 r. według źródeł finansowania	14
Wykres 4. Projekty zgodnie ze statusem realizacji według obszarów MPI 2015-2023	24
Wykres 5. Realizacja MPI 2015-2023 w latach do 31 grudnia 2024 r. (mln zł).....	27

Rekomendacja:

Departament Rozwoju Regionu rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego przyjęcie niniejszej Informacji oraz kontynuację monitorowania przez Departament Rozwoju Regionu realizacji Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2030 (MPI 2030) i Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015–2023 (MPI 2015-2023).
